Identifi	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1		Inžinierska činnosť	55 dni	Po 23.04.18	Pi 06.07.18
2		Zhotovenie realizačnej dokumentácie	15 dni	Po 23.04.18	Pi 11.05.18
3		Schválenie PD TEHO	10 dni	Po 30.04.18	Pi 11.05.18
4		Schválenie PD na TISR ????? nie je VTZ	20 dni	Po 07.05.18	Pi 01.06.18
5		Odsúhlasenie PD Dopravného značenia	20 dni	Po 07.05.18	Pi 01.06.18
6		Rozkopávkové povolenie	20 dni	Po 23.04.18	Pi 18.05.18
7		Vytýčenie sietí	30 dni	Po 23.04.18	Pi 01.06.18
8					
9		Príprava stavby	10 dni	Po 23.04.18	Pi 04.05.18
10		~~Výrub stromov~~	~~5 dni~~	~~Str 07.09.18~~	~~Pi 08.09.18~~
11		Zriadenie staveniska	5 dni	Po 23.04.18	Pi 27.04.18
12		Plán BOZP	10 dni	Po 23.04.18	Pi 04.05.18
13					
14		Zemné práce	25 dni	Pi 04.05.18	Št 07.06.18
15		Vytýčenie trasy - stavby	1 deň	Pi 04.05.18	Pi 04.05.18
16		Osadenie dopravného značenia	1 deň	Po 07.05.18	Po 07.05.18
17		Odobratie ornice	2 dni	Ut 08.05.18	Str 09.05.18
18		Spevnené plochy - odstránenie	8 dni	Po 14.05.18	Str 23.05.18
19		Oplotenie výkopu	1 deň	Št 17.05.18	Št 17.05.18
20		Výkopy	16 dni	Št 17.05.18	Št 07.06.18
21		Demontáž kanálov + šachta	12 dni	Št 24.05.18	Pi 08.06.18
22		Lávky pre pešich - vstupy do objektov	6 dni	Pi 01.06.18	Pi 08.06.18
23					
24		Demontáže	7 dni	Št 31.05.18	Pi 08.06.18
25		Demontáž potrubia ÚK	7 dni	Št 31.05.18	Pi 08.06.18
26					
27		Montáž rozvodov	56 dni	Po 04.06.18	Po 20.08.18
28		Montáž rozvodov TUV	19 dni	Po 04.06.18	Št 28.06.18
29		Lôžko potrubia	6 dni	Po 04.06.18	Po 11.06.18
30		Montáž vonkajší rozvodov TUV + vyhľadávací vodič	15 dni	Str 06.06.18	Ut 26.06.18
31		Skúšky (vizuálna, tesnosti, pevnosti, preplach)	2 dni	Ut 26.06.18	Str 27.06.18
32		Prepoje v objekte OST 2614	1 deň	Po 25.06.18	Po 25.06.18
33		Prepoje v objekte Dénešova 65-67	1 deň	Po 25.06.18	Po 25.06.18
34		Prepoje v objekte Dénešova 69-71	1 deň	Po 25.06.18	Po 25.06.18
35		Prepoje v objekte Dénešova 73-75	1 deň	Ut 26.06.18	Ut 26.06.18
36		Prepoje v objekte Dénešova 77-79	1 deň	Ut 26.06.18	Ut 26.06.18
37		Prepoje v objekte Dénešova 81-83	1 deň	Ut 26.06.18	Ut 26.06.18
38		Prepoje v objekte Dénešova 85-87	1 deň	Ut 26.06.18	Ut 26.06.18
39		Spustenie do skúšobnej prevádzky - rozvodov TUV - Dénešova 65-87	1 deň	Ut 26.06.18	Ut 26.06.18
40		Prepoje v objekte OST 2614	1 deň	Str 27.06.18	Str 27.06.18
41		Prepoje v objekte Dénešova 4	1 deň	Str 27.06.18	Str 27.06.18
42		Prepoje v objekte Dénešova 2	1 deň	Str 27.06.18	Str 27.06.18
43		Prepoje v objekte Dénešova 6	1 deň	Str 27.06.18	Str 27.06.18
44		Prepoje v objekte Dénešova 55	1 deň	Str 27.06.18	Str 27.06.18
45		Prepoje v objekte Dénešova 12	1 deň	Št 28.06.18	Št 28.06.18
46		Prepoje v objekte Dénešova 12	1 deň	Št 28.06.18	Št 28.06.18
47		Prepoje v objekte Dénešova 14	1 deň	Št 28.06.18	Št 28.06.18
48		Prepoje v objekte Dénešova 16	1 deň	Št 28.06.18	Št 28.06.18
49		Spustenie do skúšobnej prevádzky - rozvodov TUV - Dénešova 2-55	1 deň	Št 28.06.18	Št 28.06.18
50					
51		Montáž rozvodov UK	36 dni	Po 02.07.18	Po 20.08.18
52		Montáž vonkajších rozvodov ÚK	26 dni	Po 02.07.18	Po 06.08.18
53		Prepoje v objekte OST 2614	1 deň	Po 06.08.18	Po 06.08.18
54		Prepoje v objekte Dénešova 65-67	1 deň	Ut 07.08.18	Ut 07.08.18
55		Prepoje v objekte Dénešova 69-71	1 deň	Ut 07.08.18	Ut 07.08.18
56		Prepoje v objekte Dénešova 73-75	1 deň	Str 08.08.18	Str 08.08.18
57		Prepoje v objekte Dénešova 77-79	1 deň	Str 08.08.18	Str 08.08.18
58		Prepoje v objekte Dénešova 81-83	1 deň	Št 09.08.18	Št 09.08.18
59		Prepoje v objekte Dénešova 85-87	1 deň	Št 09.08.18	Št 09.08.18
60		Prepoje v objekte OST 2614	1 deň	Pi 10.08.18	Pi 10.08.18
61		Prepoje v objekte Dénešova 4	1 deň	Po 13.08.18	Po 13.08.18
62		Prepoje v objekte Dénešova 2	1 deň	Po 13.08.18	Po 13.08.18
63		Prepoje v objekte Dénešova 6	1 deň	Po 13.08.18	Po 13.08.18
64		Prepoje v objekte Dénešova 55	1 deň	Ut 14.08.18	Ut 14.08.18
65		Prepoje v objekte Dénešova 12	1 deň	Ut 14.08.18	Ut 14.08.18
66		Prepoje v objekte Dénešova 12	1 deň	Str 15.08.18	Str 15.08.18
67		Prepoje v objekte Dénešova 14	1 deň	Str 15.08.18	Str 15.08.18
68		Prepoje v objekte Dénešova 16	1 deň	Str 15.08.18	Str 15.08.18
69		Uloženie komunikačného kábla + chráničky	2 dni	Pi 03.08.18	Po 06.08.18
70		Pospájanie a skúška alarmu	2 dni	Št 02.08.18	Pi 03.08.18
71		Skúšky (tesnosti, pevnosti, predopnutie potrubia, preplach, prežíarenie zvarov)	3 dni	Str 15.08.18	Pi 17.08.18
72		Vyspravenie prestupov do objektov	6 dni	Ut 14.08.18	Ut 21.08.18
73		Zameranie novej trasy a zvarov	2 dni	Str 15.08.18	Št 16.08.18
74					
75		Spätné úpravy	29 dni	Št 16.08.18	Ut 25.09.18
76		Obsyp potrubia	4 dni	Št 16.08.18	Ut 21.08.18
77		Zásyp zeminou	5 dni	Po 20.08.18	Pi 24.08.18
78		Podkladová vrstva pod spevnené plochy	2 dni	Št 23.08.18	Pi 24.08.18
79		Spevnené plochy	8 dni	Po 27.08.18	Str 05.09.18
80		Sadové úpravy	5 dni	Po 10.09.18	Pi 14.09.18
81					
82		Komplexné skúšky 72 hodín	3 dni	Po 17.09.18	Str 19.09.18
83					
84		Zaškolenie obsluhy (návody, postupy, predpisy)	1 deň	Št 20.09.18	Št 20.09.18
85		Odovzdanie stavby	3 dni	Po 24.09.18	Str 26.09.18

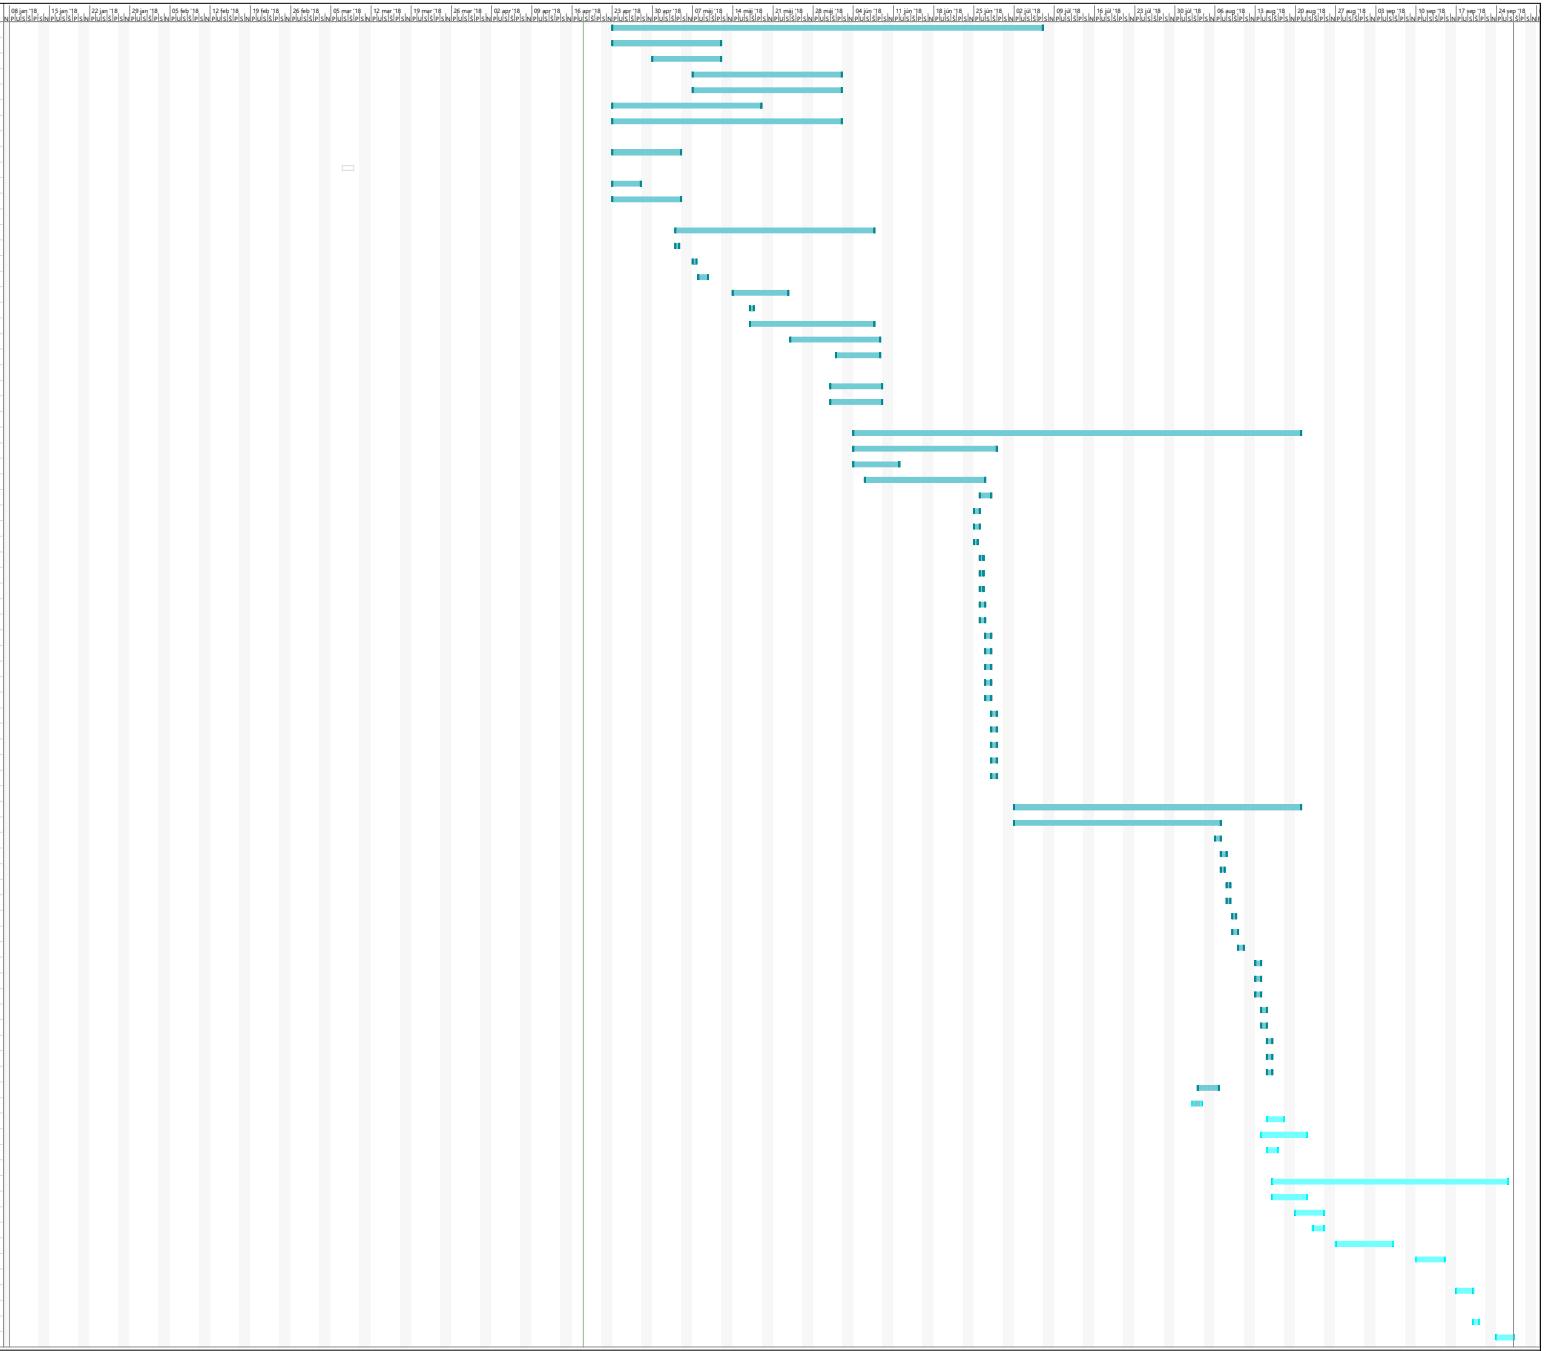

Projekt: Rekonštrukcia a moder
Dátum: Str 18.04.18

Úloha · Rozdelit · Medzník · Súhrn · Súhrn projektu · Neaktívna úloha · Neaktívny medzník · Neaktívny súhrn · Manuálna úloha · Iba trvanie · Manuálny súhrn · Manuálny súhrn · Iba začiatok · Iba dokončiť · Externé úlohy · Externý medzník · Termín · Priebeh · Manuálny priebeh
