Identifikátor	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1		Inžinierska činnosť	55 dni	Po 23.04.18	Pi 06.07.18
2		Zhotovenie realizačnej dokumentácie	15 dni	Po 23.04.18	Pi 11.05.18
3		Schválenie PD TEHO	10 dni	Po 30.04.18	Pi 11.05.18
4		Schválenie PD na TISR ????? nie je VTZ	20 dni	Po 07.05.18	Pi 01.06.18
5		Odsúhlasenie PD Dopravného značenia	20 dni	Po 23.04.18	Pi 18.05.18
6		Rozkopávkové povolenie	20 dni	Po 23.04.18	Pi 18.05.18
7		Vytýčenie sietí	30 dni	Po 23.04.18	Pi 01.06.18
8					
9		Príprava stavby	10 dni	Po 23.04.18	Pi 04.05.18
10		~~Výruby stromov~~	~~2 dni~~	~~Str 07.03.18~~	~~Štv 08.03.18~~
11		Zriadenie staveniska	5 dni	Po 23.04.18	Pi 27.04.18
12		Plán BOZP	10 dni	Po 23.04.18	Pi 04.05.18
13					
14		Zemné práce	27 dni	Ut 01.05.18	Str 06.06.18
15		Vytýčenie trasy - stavby	2 dni	Ut 01.05.18	Str 02.05.18
16		Osadenie dopravného značenia	2 dni	Pi 04.05.18	Po 07.05.18
17		Odobratie ornice	3 dni	Po 07.05.18	Str 09.05.18
18		Spevnené plochy - odstránenie	8 dni	Po 14.05.18	Str 23.05.18
19		Oplotenie výkopu	1 deň	Štv 17.05.18	Štv 17.05.18
20		Výkopy	15 dni	Ut 15.05.18	Po 04.06.18
21		Demontáž kanálov + šachta	11 dni	Štv 24.05.18	Štv 07.06.18
22		Lávky pre pešich - vstupy do objektov	6 dni	Pi 01.06.18	Pi 08.06.18
23					
24		Demontáže	7 dni	Str 23.05.18	Štv 31.05.18
25		Demontáž potrubia ÚK	7 dni	Str 23.05.18	Štv 31.05.18
26					
27		Montáž rozvodov	60 dni	Pi 25.05.18	Štv 16.08.18
28		Montáž rozvodov TUV	26 dni	Pi 25.05.18	Pi 29.06.18
29		Lôžko potrubia	6 dni	Pi 25.05.18	Pi 01.06.18
30		Montáž vonkajší rozvodov TUV + vyhľadávací vodič	16 dni	Str 30.05.18	Str 20.06.18
31		Skúšky (vizuálna, tesnosti, pevnosti, preplach)	2 dni	Str 20.06.18	Štv 21.06.18
32		Prepoje v objekte OST 2633	1 deň	Štv 21.06.18	Štv 21.06.18
33		Prepoje v objekte OC Hemerekova	1 deň	Štv 21.06.18	Štv 21.06.18
34		Prepoje v objekte Hemerekova 34	1 deň	Štv 21.06.18	Štv 21.06.18
35		Prepoje v objekte Janigova 21	1 deň	Štv 21.06.18	Štv 21.06.18
36		Spustenie do skúšobnej prevádzky - rozvodov TUV - Hemerekova OC, 34, Janigova 21	1 deň	Pi 22.06.18	Pi 22.06.18
37		Prepoje v objekte OST 2633	1 deň	Po 25.06.18	Po 25.06.18
38		Prepoje v objekte Hemerkova 35	1 deň	Po 25.06.18	Po 25.06.18
39		Prepoje v objekte Hemerkova 31-33, 27-29	1 deň	Po 25.06.18	Po 25.06.18
40		Prepoje v objekte Hemerkova 19-21, 23-25	1 deň	Ut 26.06.18	Ut 26.06.18
41		Prepoje v objekte Húskova 47	1 deň	Ut 26.06.18	Ut 26.06.18
42		Prepoje v objekte Zombova 17-19, 21-23	1 deň	Str 27.06.18	Str 27.06.18
43		Prepoje v objekte Zombova 25-27, 29-31	1 deň	Štv 28.06.18	Štv 28.06.18
44		Prepoje v objekte Zombova 33-35, 37-39	1 deň	Pi 29.06.18	Pi 29.06.18
45		Spustenie do skúšobnej prevádzky - rozvodov TUV - Hemerekova 25-35, Húskova 47, Zombova 17-39	1 deň	Pi 29.06.18	Pi 29.06.18
46					
47		Montáž rozvodov UK	34 dni	Po 02.07.18	Štv 16.08.18
48		Montáž vonkajších rozvodov ÚK	26 dni	Po 02.07.18	Po 06.08.18
49		Prepoje v objekte OST 2633	1 deň	Str 08.08.18	Str 08.08.18
50		Prepoje v objekte OC Hemerekova	1 deň	Str 08.08.18	Str 08.08.18
51		Prepoje v objekte Hemerekova 34	1 deň	Str 08.08.18	Str 08.08.18
52		Prepoje v objekte Janigova 21	1 deň	Štv 09.08.18	Štv 09.08.18
53		Prepoje v objekte Hemerkova 35	1 deň	Pi 10.08.18	Pi 10.08.18
54		Prepoje v objekte Hemerkova 31-33, 27-29	1 deň	Po 13.08.18	Po 13.08.18
55		Prepoje v objekte Hemerkova 19-21, 23-25	1 deň	Ut 14.08.18	Ut 14.08.18
56		Prepoje v objekte Húskova 47	1 deň	Ut 14.08.18	Ut 14.08.18
57		Prepoje v objekte Zombova 17-19, 21-23	1 deň	Str 15.08.18	Str 15.08.18
58		Prepoje v objekte Zombova 25-27, 29-31	1 deň	Str 15.08.18	Str 15.08.18
59		Prepoje v objekte Zombova 33-35, 37-39	1 deň	Štv 16.08.18	Štv 16.08.18
60		Uloženie komunikačného kábla + chráničky	3 dni	Po 06.08.18	Str 08.08.18
61		Pospájanie a skúška alarmu	2 dni	Po 06.08.18	Ut 07.08.18
62		Skúšky (tesnosti, pevnosti, predopnutie potrubia, preplach, prelíarenie zvarov)	3 dni	Str 08.08.18	Pi 10.08.18
63		Vyspravenie prestupov do objektov	6 dni	Pi 10.08.18	Pi 17.08.18
64		Zameranie novej trasy a zvarov	2 dni	Štv 09.08.18	Pi 10.08.18
65					
66		Spätné úpravy	31 dni	Ut 14.08.18	Ut 25.09.18
67		Obsyp potrubia	4 dni	Ut 14.08.18	Pi 17.08.18
68		Zásyp zeminou	5 dni	Štv 16.08.18	Str 22.08.18
69		Podkladová vrstva pod spevnené plochy	3 dni	Štv 23.08.18	Po 27.08.18
70		Spevnené plochy	9 dni	Po 27.08.18	Štv 06.09.18
71		Sadové úpravy	5 dni	Pi 07.09.18	Štv 13.09.18
72					
73		Komplexné skúšky 72 hodín	3 dni	Str 12.09.18	Pi 14.09.18
74					
75		Zaškolenie obsluhy (návody, postupy, predpisy)	1 deň	Ut 18.09.18	Ut 18.09.18
76		Odovzdanie stavby	3 dni	Po 24.09.18	Str 26.09.18

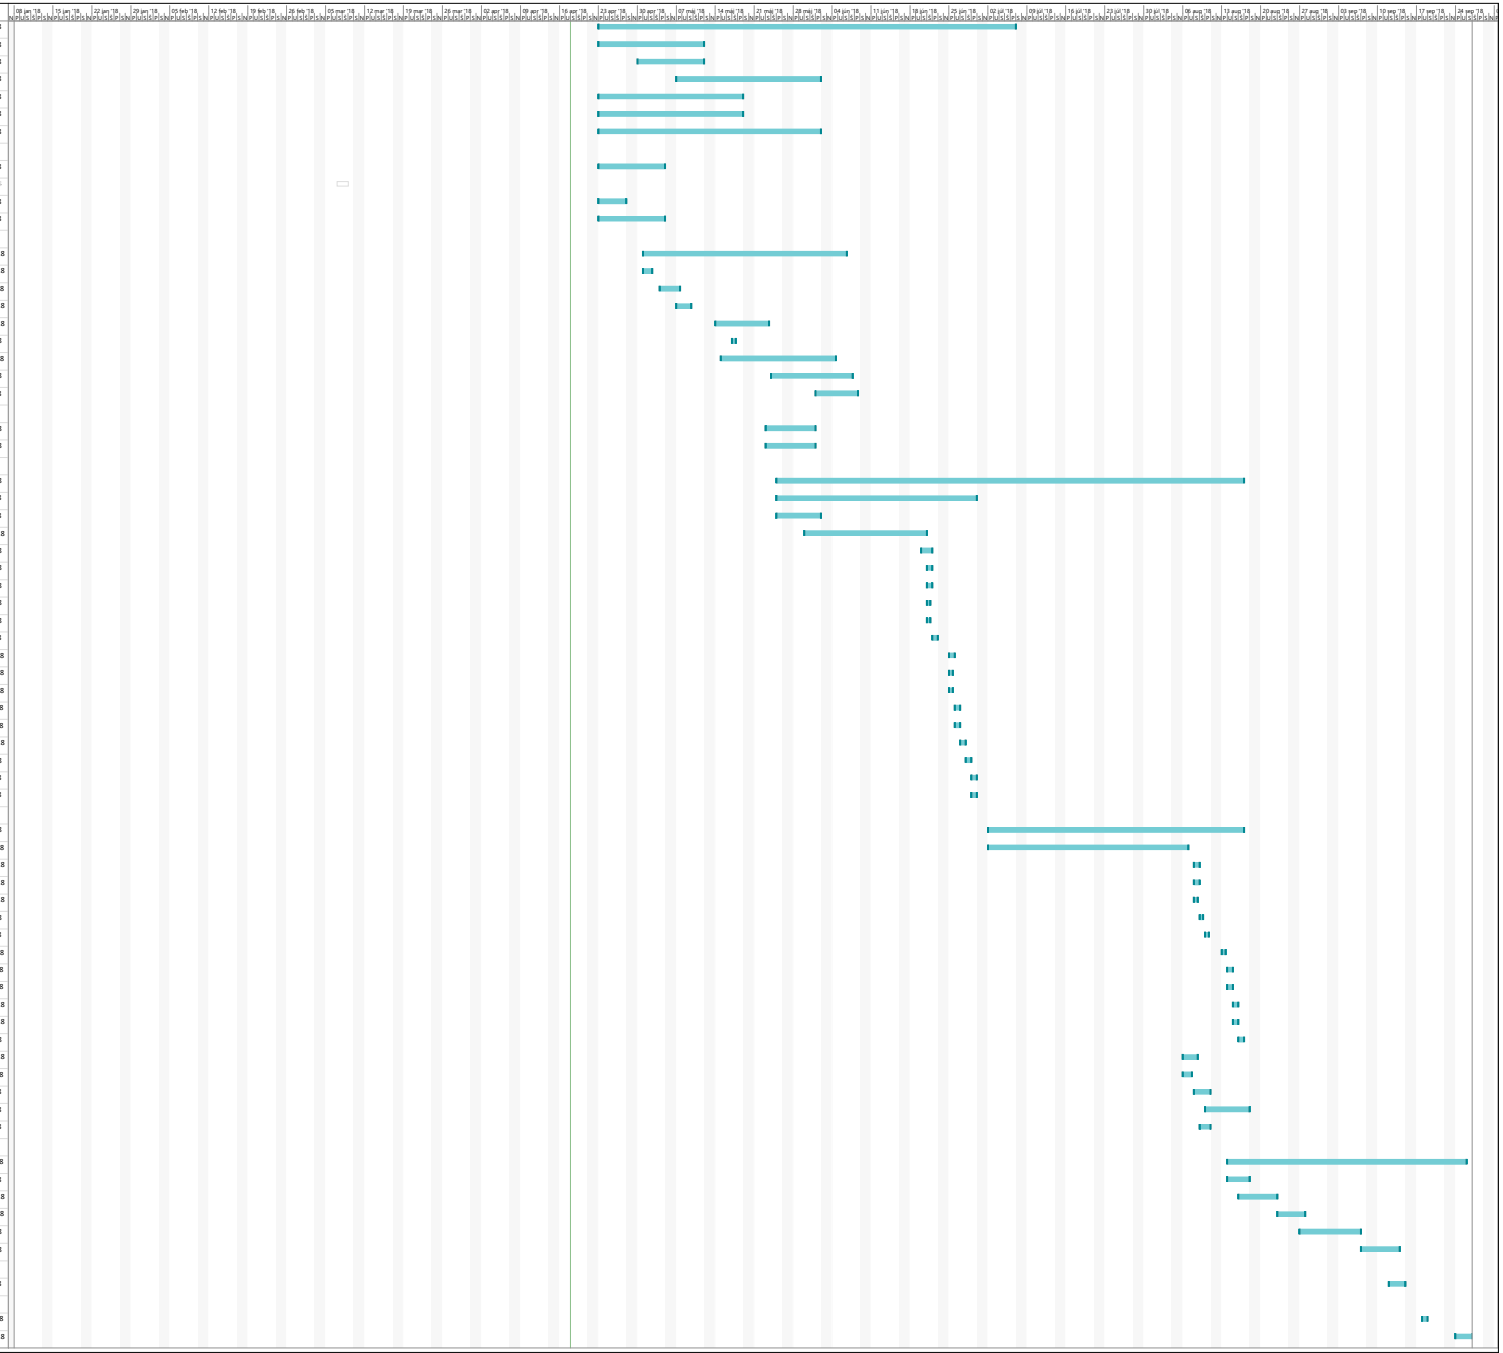

Projekt: Rekonštrukcia a moder
Dátum: Str 18.04.18

Úloha | Rozdeliť | Medzník | Súhrn | Súhrn projektu | Neaktívna úloha | Neaktívny medzník | Neaktívny súhrn | Manuálna úloha | Manuálny súhrn | Iba trvanie | Manuálny súhrn | Iba začiatok | Iba dokončiť | Externé úlohy | Externý medzník | Termín | Priebeh | Manuálny priebeh
