Identif.	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1		Inžinierska činnosť	55 dni	Po 23.04.18	Pi 06.07.18
2		Zhotovenie realizačnej dokumentácie	15 dni	Po 23.04.18	Pi 11.05.18
3		Schválenie PD TEHO	10 dni	Po 30.04.18	Pi 11.05.18
4		Schválenie PD na TISR ????? nie je VTZ	20 dni	Po 07.05.18	Pi 01.06.18
5		Odsúhlasenie PD Dopravného značenia	20 dni	Po 07.05.18	Pi 01.06.18
6		Rozkopávkové povolenie	20 dni	Po 07.05.18	Pi 01.06.18
7		Vytýčenie sietí	30 dni	Po 23.04.18	Pi 01.06.18
8					
9		Príprava stavby	10 dni	Po 23.04.18	Pi 04.05.18
10		~~Výrub stromov~~	~~2 dni~~	~~Po 05.03.18~~	~~Ut 06.03.18~~
11		Zriadenie staveniska	5 dni	Po 23.04.18	Pi 27.04.18
12		Plán BOZP	10 dni	Po 23.04.18	Pi 04.05.18
13					
14		Zemné práce	25 dni	Pi 04.05.18	Št 07.06.18
15		Vytýčenie trasy - stavby	1 deň	Pi 04.05.18	Pi 04.05.18
16		Osadenie dopravného značenia	1 deň	Po 07.05.18	Po 07.05.18
17		Odobratie ornice	2 dni	Ut 08.05.18	Str 09.05.18
18		Spevnené plochy - odstránenie	6 dni	Po 14.05.18	Po 21.05.18
19		Oplotenie výkopu	1 deň	Str 16.05.18	Str 16.05.18
20		Výkopy	8 dni	Po 21.05.18	Str 30.05.18
21		Demontáž kanálov + šachta	10 dni	Po 28.05.18	Pi 08.06.18
22		Lávky pre peších - vstupy do objektov	6 dni	Pi 01.06.18	Pi 08.06.18
23					
24		Demontáže	5 dni	Pi 01.06.18	Št 07.06.18
25		Demontáž potrubia ÚK	5 dni	Pi 01.06.18	Št 07.06.18
26					
27		Montáž rozvodov	51 dni	So 02.06.18	Pi 10.08.18
28		Montáž rozvodov TUV	21 dni	So 02.06.18	Pi 29.06.18
29		Lôžko potrubia	4 dni	So 02.06.18	Str 06.06.18
30		Montáž vonkajší rozvodov TUV + vyhladávací vodič	11 dni	Ut 05.06.18	Ut 19.06.18
31		Skúšky (vizuálna, tesnosti, pevnosti, preplach)	2 dni	Ut 19.06.18	Str 20.06.18
32		Prepoje v objekte OST 2611	1 deň	Po 25.06.18	Po 25.06.18
33		Prepoje v objekte Drábova 2-4, 6-8, 10-12	1 deň	Po 25.06.18	Po 25.06.18
34		Prepoje v objekte Drábova 5	1 deň	Po 25.06.18	Po 25.06.18
35		Prepoje v objekte Drábova 14-16, 18-20	1 deň	Ut 26.06.18	Ut 26.06.18
36		Prepoje v objekte Stierova 9-11, 13-15, 17-19	1 deň	Str 27.06.18	Str 27.06.18
37		Prepoje v objekte Stierova 1-3, 5-7	1 deň	Št 28.06.18	Št 28.06.18
38		Prepoje v objekte ZŠ Drábova	1 deň	Po 02.07.18	Po 02.07.18
39		Spustenie do skúšobnej prevádzky - rozvodov TUV	1 deň	Št 28.06.18	Št 28.06.18
40		Spustenie do skúšobnej prevádzky ZŠ Drábova - rozvodov TUV	1 deň	Po 02.07.18	Po 02.07.18
41					
42		Montáž rozvodov UK	31 dni	Po 02.07.18	Po 13.08.18
43		Montáž vonkajších rozvodov ÚK	22 dni	Po 02.07.18	Ut 31.07.18
44		Prepoje v objekte Drábova 2-4, 6-8, 10-12	1 deň	Št 02.08.18	Št 02.08.18
45		Prepoje v objekte Drábova 5	1 deň	Pi 03.08.18	Pi 03.08.18
46		Prepoje v objekte Drábova 14-16, 18-20	1 deň	Pi 03.08.18	Pi 03.08.18
47		Prepoje v objekte Stierova 9-11, 13-15, 17-19	1 deň	Po 06.08.18	Po 06.08.18
48		Prepoje v objekte Stierova 1-3, 5-7	1 deň	Ut 07.08.18	Ut 07.08.18
49		Prepoje v objekte ZŠ Drábova	1 deň	Str 08.08.18	Str 08.08.18
50		Prepoje v objekte OST 2611	1 deň	Št 09.08.18	Št 09.08.18
51		Uloženie komunikačného kábla + chráničky	1 deň	Str 01.08.18	Str 01.08.18
52		Pospájanie a skúška alarmu	2 dni	Št 02.08.18	Pi 03.08.18
53		Skúšky (tesnosti, pevnosti, predopnutie potrubia, preplach, prežiarenie zvarov)	3 dni	Pi 10.08.18	Ut 14.08.18
54		Vyspravenie prestupov do objektov	4 dni	Št 09.08.18	Ut 14.08.18
55		Zameranie novej trasy a zvarov	2 dni	Po 13.08.18	Ut 14.08.18
56					
57		Spätné úpravy	29 dni	Št 16.08.18	Ut 25.09.18
58		Obsyp potrubia	4 dni	Št 16.08.18	Ut 21.08.18
59		Zásyp zeminou	5 dni	Po 20.08.18	Pi 24.08.18
60		Podkladová vrstva pod spevnené plochy	2 dni	Št 23.08.18	Pi 24.08.18
61		Spevnené plochy	8 dni	Po 27.08.18	Str 05.09.18
62		Sadové úpravy	5 dni	Po 10.09.18	Pi 14.09.18
63					
64		Komplexné skúšky 72 hodin	3 dni	Po 17.09.18	Str 19.09.18
65					
66		Zaškolenie obsluhy (návody, postupy, predpisy)	1 deň	Št 20.09.18	Št 20.09.18
67		Odovzdanie stavby	3 dni	Po 24.09.18	Str 26.09.18

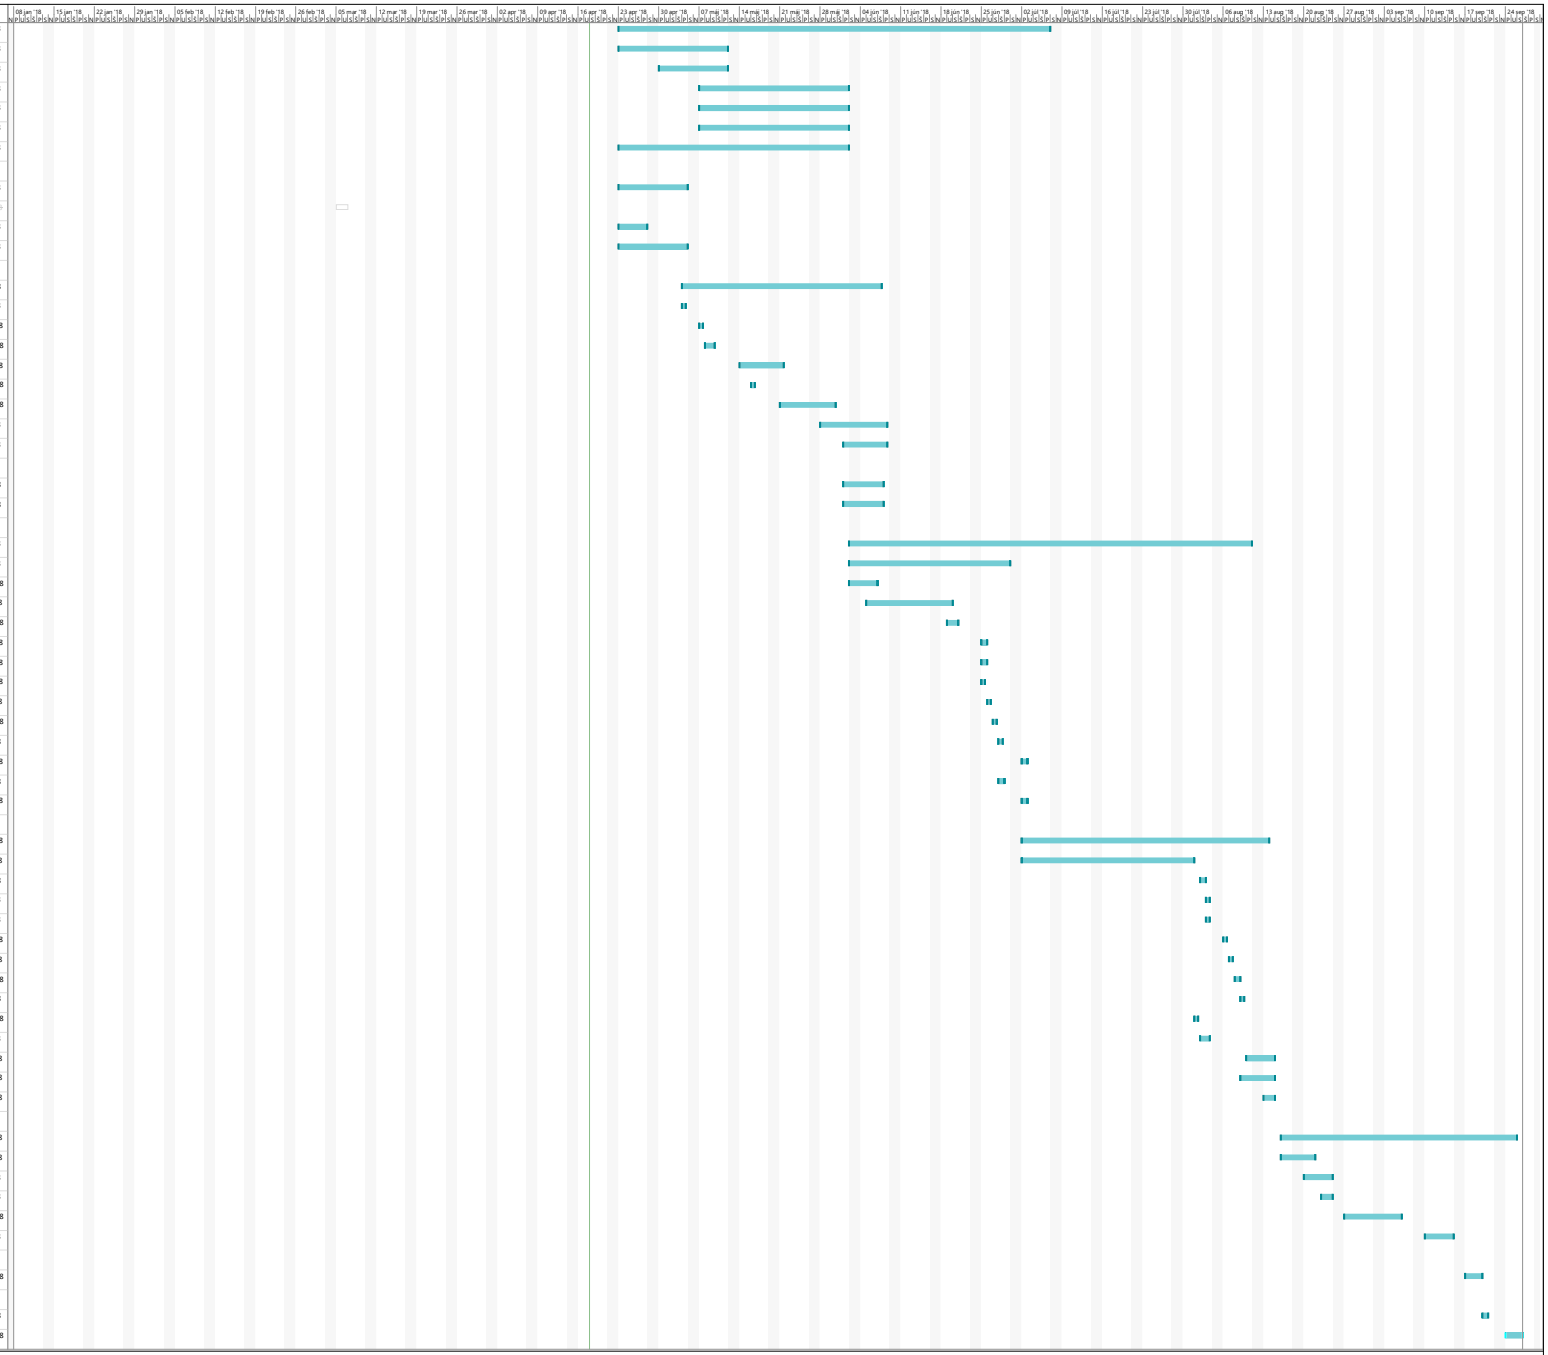

Projekt: Rekonštrukcia a moder
Dátum: Str 18.04.18

Úloha | Rozdeliť | Medzník | Súhrn | Súhrn projektu | Neaktívna úloha | Neaktívny medzník | Neaktívny súhrn | Manuálna úloha | Iba trvanie | Manuálny súhrn | Manuálny súhrn | Iba začiatok | Iba dokončiť | Externé úlohy | Externý medzník | Termín | Priebeh | Manuálny priebeh
